
## 砂川駅前地区既存建築物解体工事 進捗状況(令和4年7月)



【足場組立、養生、SuBACo内部解体、石綿除去、上屋解体】



旧パーラーグランド 石綿除去 ※作業開始前

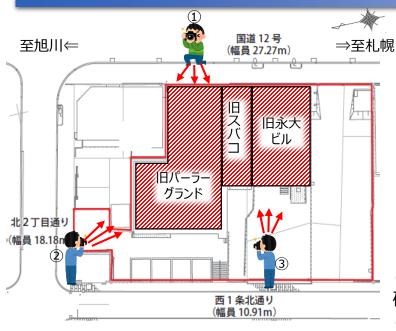

旧SuBACo内部 解体状況

- ●作業従事者の動線確保を目的に足場を設置しています。また、近隣住民の安全 確保、粉じん飛散防止、騒音防止の為、シートで覆っています。
- ●旧パーラーグランド・旧永大ビルともに、建物内部は空のため、建物内部解体は旧SuBACoを中心に行い、10日間程度で終えたところです。石綿が一部含まれる箇所があることから、除去にあたっては法令に基づき安全管理のうえ作業を行います。
- 旧永大ビル及び旧SuBACoでは、上屋解体が進んでいます。



①東側(国道12号側)



②北側(市道北2丁目通り側)



③西側(市道西1条北通り側)
